

Fusio pro řízení zakázek ve společnosti AK signal Brno

[Případová studie]

Představení společnosti



Společnost AK signal Brno a.s. je významným českým výrobcem a dodavatelem sdělovací, zabezpečovací a automatizační techniky v oblasti železničního provozu.

Na základě znalostí a zkušeností realizuje projekty v oboru sdělovacích a zabezpečovacích zařízení. Společnost se věnuje jejich vývoji, výrobě, montáži, opravám, údržbě, revizím i technickým prohlídkám a zkouškám.

Posláním společnosti je prostřednictvím inovativních a současně i stávajících osvědčených řešení provádět modernizaci a opravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení pro železniční provoz a tím zvyšovat bezpečnost a pružnost železniční dopravy.

AK signal Brno a.s. je partnerem pro provozovatele železniční infrastruktury, zejména pro Správu železniční dopravní cesty, s působením především v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina, ale současně při dodávkách vlastních produktů s působením v celé České republice a na Slovensku.



Jak Fusio pomáhá?



„Fusio nám pomáhá s komplexním řízením zakázek. Od nabídek, objednávek a smluv přes realizaci zakázek, Ganttův graf, materiál a skladové hospodářství až po evidenci fakturace.“ Ing. Martin Šalé, provozní náměstek ředitele, AK signal Brno a.s.



„Fusio nám pomohlo propojit software Money S4 s výrobou. Sdílíme tak informace o aktuálním stavu materiálu ve skladu s pracovníky, kteří do účetního softwaru nemají přístup.“ Ing. Ladislav Polcar, ředitel společnosti, AK signal Brno a.s.

Když už obyčejné tabulky nestačí

S rostoucím počtem zakázek, které firma realizuje, vzniká potřeba jejich efektivního řízení. Nehledě na obor, ve kterém společnost působí. Jako přechodné řešení se často volí různé formy tabulek, oběžníků, vnitrofiremních norem, sdílených souborů dat apod. V určitém okamžiku se však management v dokumentech začne ztrácet, aktualizace dat je časově náročná a přijetí potřebného rozhodnutí vyžaduje enormní úsilí. Tehdy nastává vhodná doba pro optimalizaci procesu.

Grafy, reporting a optimální využití kapacit

Pro vedoucího pracovníka je ideálním výstupem z databáze informací grafické zobrazení. Z jediného grafu může rychlým pohledem zjistit aktuální stav všech potřebných zakázek. Ocení i automatický systém kontroly nad plněním dílčích povinností zaměstnanců, který jej automaticky upozorní na problémové stavy i jiné události, jaké si předem vydefinoval. Proces tak nebude potřebovat jeho neustálý aktivní dozor. Přehledný graf mu umožní na časové ose zobrazit všechny naplánované zakázky a upravovat např. aktuální nabídkové ceny tak, aby optimalizoval využití výrobní kapacity. V případě nižšího počtu aktuálně naplánovaných zakázek, může jít s cenou dolů a uzavřít obchod, který firmě umožní překlenout méně využitá období. V případě vyššího množství již uzavřených a naplánovaných zakázek, může naopak zvolit vyšší cenu do nabídky a množství projektů tím do budoucna regulovat.

Řízení zakázek ve Fusio – Ganttův graf, workflow, notifikace

Přesně taková situace a potřeba nastala ve společnosti AK signal Brno, pro kterou bylo, na přání jejich managementu, ve Fusio vytvořeno Grafické rozhraní zakázek. Toto rozhraní sdružuje informace z několika samostatných evidencí ve formě tzv. Ganttova diagramu. Dále bylo v systému nastaveno workflow umožňující automatizaci jednotlivých kroků realizace a začleňující všechny profese podílející se na zakázce (např. nabídkář, přípravář, stavbyvedoucí, fakturant apod.) Fusio celý proces realizace zakázky zastřešuje a jednotlivé kroky kontroluje. O zjištěných skutečnostech informuje odpovědné pracovníky pomocí krátkých zpráv, které zasílá formou přehledných tabulek do e-mailu dotyčného a nenutí ho tak sledovat stav plnění úkolů přímo v systému a na PC.

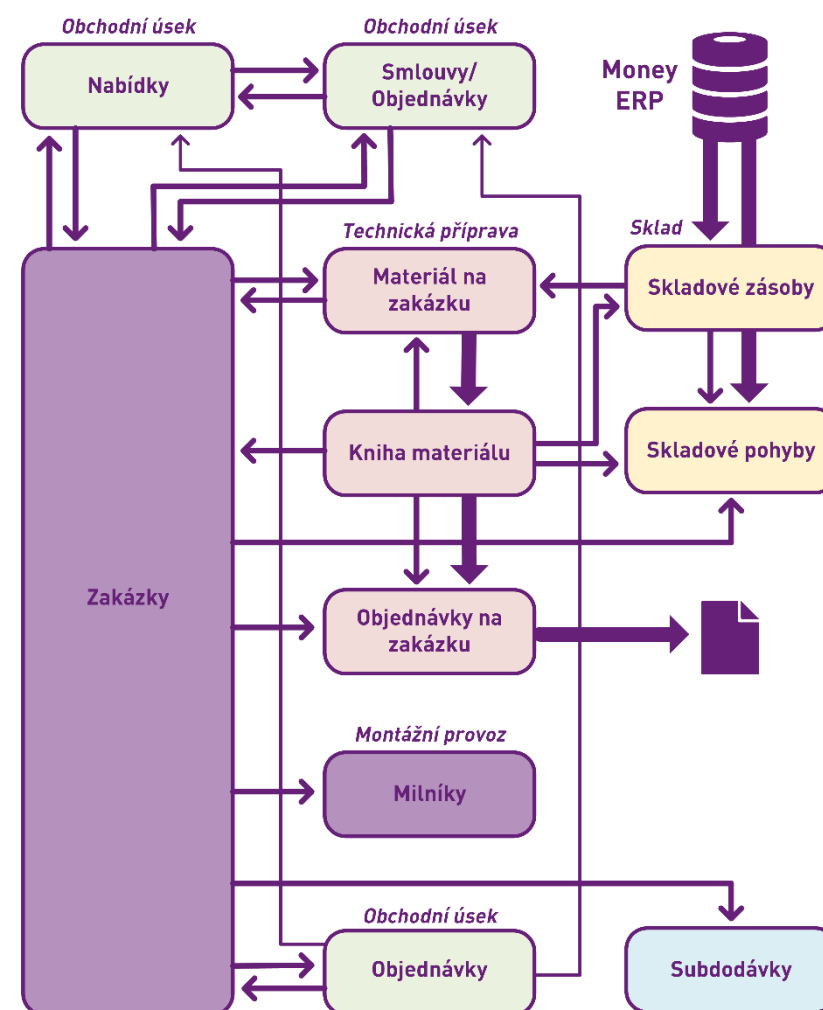


Schéma procesu řízení zakázek. (Převzato od Ing. Ladislav Polcar, ředitel společnosti AK signal Brno a.s.)



Kontakty

V záložce Kontakty jsou uloženy kontaktní údaje o firmách a osobách. Adresář lze importovat z jiného informačního systému firmy, např. ERP, nebo může být samostatně spravován v systému Fusio. Při zadávání nového kontaktu je možné automaticky načíst ID datové schránky a díky propojení se systémem státní správy ARES také verifikovat údaje dle IČO.

Kontakty (1) Kompletní přehled obchodních případů Přílohy

Osoby

Typ	VIP	Název	Funkce	Firma
Os...	-	Petr Řezníček	ředitel, zástupce jednatele	EKO servis Zábřeh s.r.o.

Firma (Editace)

Název: ANTS spol. s.r.o.

IČO: 26902711 DIČ: CZ26902711

Soud spisové značky: Krajský soud v Brně Spisová značka: C 44278 Datová schránka: ma2mptz

ARES poslední aktualizace: Zadejte datum Zadejte

Formulář pro zadání nového kontaktu s možností doplnit data automaticky z ARES a načíst adresu datové schránky

Pohled na celý adresář

Kontakt k vybranému záznamu

Nabídky

Agenda Nabídky slouží pro evidenci Poptávek, jejich zpracování v Nabídky a následný přechod v Zakázky. K poptávkám jsou přiloženy podklady a jsou dále zpracovány zodpovědným pracovníkem, který rozhodne, jestli se budou realizovat, příp. změní jejich stav a přesune je ke zpracování rozpočtu. Rozpočtář jej připraví a uloží mezi přílohy. Zodpovědný pracovník následně rozpočet zkontroluje a schválí či zamítne. Pokud ho schválí, je odeslána Nabídka. Je-li nabídka úspěšná, změní zodpovědná osoba její stav na „realizace“ a vzniká automaticky nová Zakázka. O změnách stavů a nově přidělených úkolech z toho plynoucích jsou zodpovědní pracovníci informováni e-mailem.

Fusio Kontakty Smlouvy/Objednávky Nabídky Zakázky Sklad Personalistika Nastavení Návoděda

Nabídky Smlouvy/Objednávky Grafické zobrazení zakázek Kniha materiálu Skladové položky Objednávky na zakázku

Navigace: Nabídky > Seznam nabídek (Editace)

OK Zrušit Použít Aktualizovat Nastavit Tisk

Číslo nabídky: NAB2019/0003
 Typ nabídky: Realizace
 Datum poptávky: 4. září 2018
 Číslo zakázky: 467811/18
 Objednatel: STAND CZ spol. s r.o., Albin Černíč
 Termín odevzdání nabídky: 20. září 2018
 Poslední použité číslo zakázky: 4679
 Název: Elektrifikace trati
 Předmět:

Přezkoumání zakázky
☒ Zakázka přezkoumaná
 Slekovič Quido
 18. prosince 2018
 Stav: Zpracovat

Nabídka
☒ Založení
 20. září 2018
 Slekovič Quido
☒ Zpracování rozpočtu
 21. září 2018
 Slekovič Quido
☒ Schválení rozpočtu
 24. září 2018
 Kittlička Metoděj
☒ Sestavení a odeslání nabídky
 25. září 2018
 Ohrablová Džamila
 Nabídková cena bez DPH: 1823000,00 Kč
 Způsob odeslání: Email

Poznámka

U každého seznamu se vytváří historie změn, kde lze najít, kdo, kdy a jak se záznamy pracoval

Při zadávání lze zvolit typ nabídky

Odpovědný pracovník zakázku posoudí a zvolí další postup

Datum a čas	Uživatel	Seznam	Typ změny
19.02.2019 15:45:29	Quido Slekovič	Zakázky	Zobrazení
05.02.2019 14:00:44	Quido Slekovič	Zakázky	Editace
05.02.2019 13:18:22	Ohrablová Džamila	Zakázky	Zobrazení
05.02.2019 13:09:00	Quido Slekovič	Zakázky	Zobrazení
29.01.2019 11:25:37	Lasíková Žitomíra	Zakázky	Zobrazení
04.01.2019 12:00:16	Quido Slekovič	Zakázky	Zobrazení
11.12.2018 15:17:44	Špilka Květoslav	Zakázky	Editace
11.12.2018 15:17:01	Quido Slekovič	Zakázky	Zobrazení
07.12.2018 13:59:46	Quido Slekovič	Zakázky	Editace
07.12.2018 13:57:36	Wolgemuth Aron	Zakázky	Zobrazení
07.12.2018 13:57:19	Wolgemuth Aron	Zakázky	Editace
07.12.2018 13:57:12	Quido Slekovič	Zakázky	Zobrazení
07.12.2018 13:56:02	Špilka Květoslav	Zakázky	Přidání

Editor Přílohy (13) Historie (82)

Ukázka formuláře
pro zadání nabídky

Fusio Kontakty Smlouvy/Objednávky Nabídky Zakázky Sklad Personalistika Nastavení Nápvěda

Zakázky x Nabídky x Uživatelé x

Navigace: Nabídky

Vše Filtr Nastavení filtru Tisk Graf Aktualizovat Nastavit Přidat Upravit Kopírovat Smazat

	Číslo nabídky	Číslo zakázky	Název	Objednatel	Předmět	Nabídková cena bez DPH	Měna	Datum poptávky	Založení - osoba	Založení - datum	Zpracování - osoba	Zpracování - datum	Termín odevzdání nabídky
						Σ 111 500 000,00							
	NAB2019/0001	40500/18	Oprava mostu	ANTS spol. s r.o., Benedikt Křištof		500 000,00	Kč	16.10.2018	Slekovič Quido	05.12.2018	Slekovič Quido	05.12.2018	02.11.2018
	NAB2019/0002	405014/18	Stavba přejezdu	STAND CZ spol. s r.o., Albín Černíček		700 000,00	Kč	19.07.2018	Slekovič Quido	06.12.2018			20.08.2018
	NAB2019/0004	416277/18	Stavba nádraží	STAND CZ spol. s r.o., Albín Černíček		100 000 000,00		03.12.2018	Slekovič Quido	11.12.2018			11.12.2018
	NAB2019/0004	432457/18	Stavba zdi	Obec Merkur, Sídlo firmy		300 000,00	Kč	02.10.2018	Slekovič Quido	11.12.2018			15.10.2018
	NAB2019/0003	467811/18	Elektrifikace trati	STAND CZ spol. s r.o., Albín Černíček		10 000 000,00	Kč	04.09.2018	Slekovič Quido	20.09.2018	Slekovič Quido	21.09.2018	20.09.2018
	NAB2019/0004		úprava vedení	STAND CZ spol. s r.o., Albín Černíček			Kč	31.01.2019	Slekovič Quido	28.01.2019			07.02.2019
	NAB2019/0007	4679	oprava nadjezdu Brno	ANTS spol. s r.o., Radmil Karina			Kč	17.01.2019	Slekovič Quido	28.01.2019			23.01.2019
	NAB2019/0008	456788	kanalizace a odvodnění	Building a.s., Květoslav Včelka			Kč	03.01.2019	Slekovič Quido	29.01.2019			24.01.2019
	NAB2019/0009		oprava tratě	ANTS spol. s r.o.,			Kč	05.02.2019	Slekovič Quido	05.02.2019			28.02.2019

Seznam všech nabídek

Zakázka (1) Materiál na zakázku (3) Smlouva/Objednávka (2) Fakturace (1) Přílohy (13)

Všechny přílohy Přidat Otevřít Stáhnout Smazat Aktualizovat

Datum a čas	Typ	Uživatel	Titulek	Typ souboru	Soubor
10.05.2017 14:28:33	Nabídka	Augustýn Dolan	Rozpočty	Xls	11.Rekapitulace ceny PZS 26,897 a 27,262.xls
10.05.2017 14:28:33	Nabídka	Augustýn Dolan	Rozpočty	Xls	Soupisys prací km 26,897 a 27,262.xls
10.05.2017 14:29:32	Nabídka	Augustýn Dolan	Nabídka	pdf	1-90.pdf
10.05.2017 14:29:32	Nabídka	Augustýn Dolan	Nabídka	pdf	91-150.pdf
10.05.2017 14:29:32	Nabídka	Augustýn Dolan	Nabídka	Xls	xls
10.05.2017 14:29:32	Nabídka	Augustýn Dolan	Nabídka	doc	Nabídka - obálka.doc
10.05.2017 14:29:33	Nabídka	Augustýn Dolan	Nabídka	doc	Nabídka - titulní strana.doc
10.05.2017 14:29:33	Nabídka	Augustýn Dolan	Nabídka	doc	Obsah nabídky a krycí listy.doc
10.05.2017 14:29:33	Nabídka	Augustýn Dolan	Nabídka	doc	Přílohy.doc
10.05.2017 14:29:33	Nabídka	Augustýn Dolan	Nabídka	doc	SMLOUVA _PR.doc
10.05.2017 14:29:33	Nabídka	Augustýn Dolan	Nabídka	doc	 geotechnika.doc
10.05.2017 14:29:33	Nabídka	Augustýn Dolan	Nabídka	doc	doc
10.05.2017 14:29:33	Nabídka	Augustýn Dolan	Nabídka	Xls	Soupisys prací km 26,897 a 27,262.xls

Podagendy a přílohy k označené nabídce

Komentář

Fusio Kontakty Smlouvy/Objednávky Nabídky Zakázky Sklad Personalistika Nastavení Nápořád

Nabídky x Smlouvy/Objednávky x Grafické zobrazení zakázek x Kniha materiálů x Skladové položky x Objednávky na zakázku x Firmy x Zakázky x

Navigace: Zakázky > Zakázka (Editace)

OK X Zrušit Použít Aktualizovat Nastavit Tisk

Základní identifikace

Číslo zakázky: 432457/18
 Číslo nabídky: NAB2019/0004
☐ Zakázka malého rozsahu ☒ Zobrazovat
☐ Servis zakázky ☐ Vývoj

Objednatel: Obec Merkur, Sídlo firmy
 Název: Stavba zdi
 Plánované zahájení: 15. listopadu 2018
 Plánované ukončení: 18. června 2019

Výklad stavby

Stavbyvedoucí: Veiser Norman
 Datum výkladu stavby: 7. prosince 2018

☒ Zajištění PD: vše ok ☒ Doručena projektová dokumentace

☒ Subdodávky: domluvit předání osky

☒ Regulace:
 Regulace - osoba: Lasiková Žitomíra

☒ UTZ:
 UTZ - osoba: Čerman Bojan

☒ Požadavek na úsek technika:
 Požadavek na úsek technika - poznámka:

☒ Příprava stavby:
☒ Eduard Steinhauer ☐ Michal Novák ☐ Luboš Císař

Administrativa zakázky

☒ Provedena příprava: Přípravu provedl: Slekovič Quido
 Datum provedení přípravy: 7. prosince 2018

☐ Předání zakázky: Záznam o předání zakázky provedl:
 Datum předání zakázky: Zadejte datum

☐ Provedena archivace: Archivaci provedl:
 Datum provedení archivace: Zadejte datum

Komentář

Editor Přílohy Historie (11)

Číslo zakázky	Zákazník	Název	Místo realizace	Zahájení	Dokončení
432457/18	Obec Merkur	Stavba zdi	Praha	15.11.2018	18.6.2019
456788	Buildino a.s.	kanalizace a odvodnění	Brno		

*Ukázka formuláře pro
zadání nové zakázky
a e-mailové notifikace*

Fusio Kontakty Smlouvy/Objednávky Nabídky Zakázky Sklad Personalistika Nastavení Nápověda

Nabídky Smlouvy/Objednávky Grafické zobrazení zakázek Kniha materiálů Skladové položky Objednávky na zakázku Firmy **Zakázky**

Navigace: **Zakázky**

Vše Filtr Nastavení filtru Tisk Graf Aktualizovat Nastavit Přidat Upravit Kopírovat Smazat

	Číslo zakázky	Plánované zahájení	Název	Nabídka	Objednatel	Stavbyvedoucí	Plánované ukončení	Výklad stavby	Zajištění PD	Zajištění PD poznámka	Subdodávky	Subdodávky poznámka	Regulace	Regulace osoba	Regulace
	416277/18	01.01.2019	Stavba nádraží	NAB2019/0004	STAND CZ spol. s r.o., Albín Čer...	Šohajda Denis	31.08.2019	06.12.2018	✓	v pořádku	✓	dodržet termín	✓	Lasiková Žitomíra	projedn
	467811/18	01.10.2018	Elektrifikace trati	NAB2019/0003	STAND CZ spol. s r.o., Albín Čer...	Zelník Dušan	31.07.2019	10.12.2018	✓	zajištěna	✓	objednány	✓	Zelník Dušan	
	432457/18	15.11.2018	Stavba zdi	NAB2019/0004	Obec Merkur, Sídlo firmy	Veiser Norman	18.06.2019	07.12.2018	✓	vše ok	✓	domluvit předání úseku	✓	Lasiková Žitomíra	
	40500/18	06.11.2018	Oprava mostu	NAB2019/0001	ANTS spol. s r.o., Benedikt Křišť...	Falátek Aaron	31.05.2019	05.12.2018	✓	domluveno	✓	objednáno	✓	Gančík Koridon	regulov
	405014/18	03.09.2018	Stavba přejezdu	NAB2019/0002	STAND CZ spol. s r.o., Albín Čer...	Remišovský Iul...	30.11.2018	06.12.2018	✓		✓		✓		
	4679		oprava nadjezdu Brno	NAB2019/0007	ANTS spol. s r.o., Radmil Karina										
	456788		kanalizace a odvodnění	NAB2019/0008	Building a.s., Květoslav Včelka	Veiser Norman		05.02.2019							

Nabídka (1) Smlouva/Objednávka Subdodávky Milníky zakázky Materiál na zakázku Skladové výdejky na zakázku Fakturace (1) Přílohy

Vše Filtr Nastavení filtru Tisk Graf Aktualizovat Přejít Nastavit Přidat Upravit Kopírovat Smazat

	Číslo nabídky	Číslo zakázk	Zpracování - osoba	Název	Objednatel	Předmět	Nabídková cena bez DPH	Měna	Datum poptávky	Založení - osoba	Založení - datum	Zpracování - datum	Termín odevz	Schválení - osob
						Σ	0,00							
	NAB2019/0008	456788		kanalizace a odvodnění	Building a.s., Květoslav Včelka			Kč	03.01.2019	Sleковиč Quido	29.01.2019		24.01.2019	

Podagendy s informacemi k označené zakázce

Ukázka agendy Zakázky (celkový pohled)

Smlouvy/Objednávky

Jedná se o samostatnou agendu, kde jsou evidovány vlastní Smlouvy a Objednávky v elektronické podobě. Dokumenty jsou chráněny systémem přístupových práv. Někteří uživatelé mohou pouze vidět, že smlouva existuje, další ji mohou stáhnout v elektronické podobě a ti s nejvyšším oprávněním mohou editovat její parametry. Tato agenda má podagendy Nabídky a Zakázky. Ke zvolené smlouvě či objednávce se v podseznamu vyfiltrují a zobrazí příslušná nabídka a zakázka.

Fusio
Kontakty
Smlouvy/Objednávky
Nabídky
Zakázky
Sklad
Personalistika
Nastavení
Nápověda

Nabídky
Smlouvy/Objednávky
Grafické zobrazení zakázek
Kniha materiálu
Skladové položky
Objednávky na zakázku
Firmy
Zakázky
Systémový log
Smlouvy/Objednávky

Navigace: Smlouvy/Objednávky

Vše
Filtr
Nastavení filtru
Tisk
Graf
Aktualizovat
Nastavit
Přidat
Upravit
Kopírovat
Smazat

	Typ smluvního vztahu	Zakázka	Číslo smlouvy/objednávky	Předmět smlouvy	Stav	Garant smlouvy	Číslo smlouvy obchodního partnera	Datum podpisu	Partner	Správce smlouvy - stav	Správce smlouvy - datum	Ekonom
	Objednávka	40500/18	OBP2019/0001	Oprava pilířů	Návrh		110		Kosmická a.s., Benjamin Sova			
	Smlouva	405014/18	223		Návrh	Kitlička Metoděj	123/50		Building a.s., Sídlo firmy			
	Smlouva	416277/18	246	Stavba nádraží	Návrh	Pyrchalová Lia	35680/18		Building a.s., Květoslav Včelka			
	Smlouva	416277/18	2367/18	Subdodávka	Návrh	Pyrchalová Lia	4568/18		ANTS spol. s r.o., Benedikt Křištof			
	Smlouva	432457/18	23756	výkopové práce	K podpi...	Slekovič Quido	0975		Building a.s., Květoslav Včelka			
	Smlouva		34589/18	subdodávka - povrchové úpravy zdi	Návrh	Kitlička Metoděj	223145		Building a.s., Sídlo firmy			
	Objednávka	467811/18	OBP2019/0002	elektrifikace úseku A5	Návrh		4345		Elektrifikace spol. s r.o., Sídlo firmy			
	Objednávka		OBP2019/0003		Návrh							
	Objednávka		OBP2019/0004		Návrh							
	Objednávka	432457/18	OBP2019/0005		Návrh				ANTS spol. s r.o., Benedikt Křištof			
	Smlouva	467811/18	456072	kabeláž	Návrh	Pyrchalová Lia	534		Elektrifikace spol. s r.o.,			
	Smlouva		4367	terénní práce	Návrh	Kitlička Metoděj	3090		Výkopy spol s r.o., Sídlo firmy			
	Objednávka	416277/18	OBP2019/0006	stavba nádraží	Návrh		44		STAND CZ spol. s r.o., Albin Černíč			
	Objednávka	405014/18	OBP2019/0007	stavba přejezdu	Návrh		4327		ANTS spol. s r.o.,			

Nabídka (1)
Zakázka (1)
Přílohy (2)

Nabídky aktuálního fiskálního roku
Filtr
Nastavení filtru
Tisk
Graf
Aktualizovat
Přejít
Nastavit
Přidat
Upravit
Kopírovat
Smazat

	Číslo nabídky	Číslo zakázek	Zpracování - osoba	Název	Objednatel	Předmět	Nabídková cena bez DPH	Měna	Datum poptávky	Založení - osoba	Založení - datum	Zpracování - datu	Termín odevz	Schválení - osot
							Σ	500 000,00						
	NAB2019/0001	40500/18	Slekovič Quido	Oprava mostu	ANTS spol. s r.o., Benedikt Křištof		500 000,00	Kč	16.10.2018	Slekovič Quido	05.12.2018	05.12.2018	02.11.2018	Kitlička Metoděj



Reporty

Příklady automatických reportů odesílaných systémem Fusio uživatelům na e-mail a informujících o skutečnostech a úkolech, které nastaly v závislosti na posunu u konkrétní sledované události nebo na základě času a povinností z toho pro uživatele vyplývajících:

Fusio Service
5. února 2019 13:53:59 SEČ
Komu: Augustýn Dolan
Nabídka k odeslání nebo omluva

Nabídka číslo NAB2019/0002 k odeslání nebo omluva.

Číslo nabídky	NAB2019/0002
Typ nabídky	Projektant
Datum poptávky	19.07.2018
Číslo zakázky	405014/18
Objednatel	STAND CZ spol. s r.o., Albin Černíč
Termín odevzdání nabídky	20.08.2018
Poslední použité číslo zakázky	4162
Název	Stavba přejezdu
Předmět	
Přezkoumání zakázky	
Zakázka přezkoumaná	Ne
Přezkoumání - osoba	
Přezkoumání - datum	
Stav	
Nabídka	
Založení	Ano
Založení - datum	06.12.2018
Založení - osoba	Slekovič Quido
Zpracování rozpočtu	Ne
Zpracování - datum	
Zpracování - osoba	
Nabídková cena bez DPH	700000
Měna	Kč
Schválení rozpočtu	Ano
Schválení - datum	06.12.2018
Schválení - osoba	Kitlička Metoděj
Sestavení a odeslání nabídky	Ano
Odeslání - datum	06.12.2018
Odeslání - osoba	
Způsob odeslání	Podatelna
Poznámka	

[Zobrazit záznam](#)

Odkaz otevře příslušný
záznam ve Fusio

Fusio Service
5. února 2019 13:53:57 SEČ
Komu: Denis Šohajda
Výklad stavby - byla dodána projektová dokumentace

U zakázky 786432/96 byla doručena projektová dokumentace.

ANTS Fusio Service 18.11.1.0, 6.12.2018 16:28:55

Fusio Service
5. února 2019 13:53:57 SEČ
Komu: Žitomíra Lasíková, Denis Šohajda
Byl proveden výklad stavby u zakázky 786432/96 Stavba nádraží

U zakázky 786432/96 jste byl nastaven jako zodpovědná osoba u regulace ve výkladu stavby.

ANTS Fusio Service 18.11.1.0, 6.12.2018 16:28:55

Od: ANTS Fusio Service fusio@aksignal.cz
Předmět: Přidělení nové stavby
Komu: Veiser Norman veiser@aksignal.cz

ANTS Fusio Service
Přidělení zakázky
V systému Fusio Vám byla přidělena nová zakázka.

Nová realizační zakázka					
Číslo zakázky	Zákazník	Název	Místo realizace	Zahájení	Dokončení
432457/18	Obec Merkur	stavba zdi	Praha	15.11.2018	18.6.2019

Všechny zakázky Vám přidělené					
Číslo zakázky	Zákazník	Název	Místo realizace	Zahájení	Dokončení
432457/18	Obec Merkur	Stavba zdi	Praha	15.11.2018	18.6.2019
456788	Buildino a.s.	kanalizace a odvodnění	Bmo		

Fusio Service
5. února 2019 13:54:12 SEČ
Komu: Augustýn Dolan
Smlouvy ke schválení

Smlouvy ke schválení									
Předmět smlouvy	Stav	Garant smlouvy	Číslo smlouvy obchodního partnera	Datum podpisu	Partner	Zakázka	Správce smlouvy	Správce smlouvy - stav	Správce smlouvy - datum
	Návrh	Kitlička Metoděj	123/50		Building a.s., Sídlo firmy	405014/18	Dolan Augustýn		
Stavba nádraží	Návrh	Pyrchalová Lia	35680/18		Building a.s., Květoslav Včelka	416277/18	Dolan Augustýn		
Subdodávka	Návrh	Pyrchalová Lia	4568/18		ANTS spol. s r.o., Benedikt Křištof	416277/18	Dolan Augustýn		

ANTS Fusio Service 18.11.1.0, 11.12.2018 8:00:52

Fusio Service
5. února 2019 13:53:58 SEČ
Komu: Iulian Remišovský, Quido Sleковиč, Žitomíra Lasíková, Quido Sleковиč
Založení nové zakázky

Založena nová zakázka 786432/96

ANTS Fusio Service 18.11.1.0, 6.12.2018 16:28:57

Fusio Service
5. února 2019 13:53:56 SEČ
Komu: Metoděj Kitlička, Quido Sleковиč, Lia Pyrchalová
Nová smlouva se zahájeným schvalovacím procesem


Nová smlouva číslo 223 se zahájeným schvalovacím procesem.

Souhlas garanta se zpracovanou smlouvou	Ne
Typ smluvního vztahu	Smlouva
Číslo objednávky	
Číslo smlouvy	223
Odborný garant	Kitlička Metoděj
Souhlas s objednávkou	Ne
Souhlas s objednávkou datum	
Souhlas s objednávkou jméno	
Stav	Návrh
Zobrazovat v grafickém přehledu	Ano
Předmět smlouvy/objednávky	
Měna	Kč
Částka dle SOD	200000
Objednávka uzavřena	Ne
Partner	Building a.s., Květoslav Včelka
Číslo smlouvy/objednávky obchodního partnera	123/50
Hlídat v registru smluv	Ano
Na dobu neurčitou	Ne
Datum přijetí objednávky	
Datum podpisu	
Datum vystavení objednávky	
Datum platnosti do	01.03.2019
Termín	
Prodloužení platnosti smlouvy	
Zakázka	405014/18: Stavba přejezdu (STAND CZ spol. s r.o., Albin Černíč)
Datum zveřejnění v registru smluv	06.12.2018
Zaslat notifikaci	
Schvalování smlouvy	
Zahájení schvalovacího procesu	Ano
Zkrácený schvalovací proces	Ne
Poznámky, připomínky	
Ekonom společnosti	Pyrchalová Lia
Ekonom společnosti - stav	
Ekonom společnosti - datum	
Provozní náměstek ředitele	Slekovič Quido
Provozní náměstek ředitele - stav	
Provozní náměstek ředitele - datum	
Ředitel	Kitlička Metoděj



Grafické zobrazení zakázek

Grafické zobrazení je souhrn údajů z několika agend tak, aby management na první pohled přehled o termínech a mohl je porovnat mezi jednotlivými zakázkami. Zobrazení je interaktivní a po poklepnutí na záznam se údaj otevře v příslušné agendě.

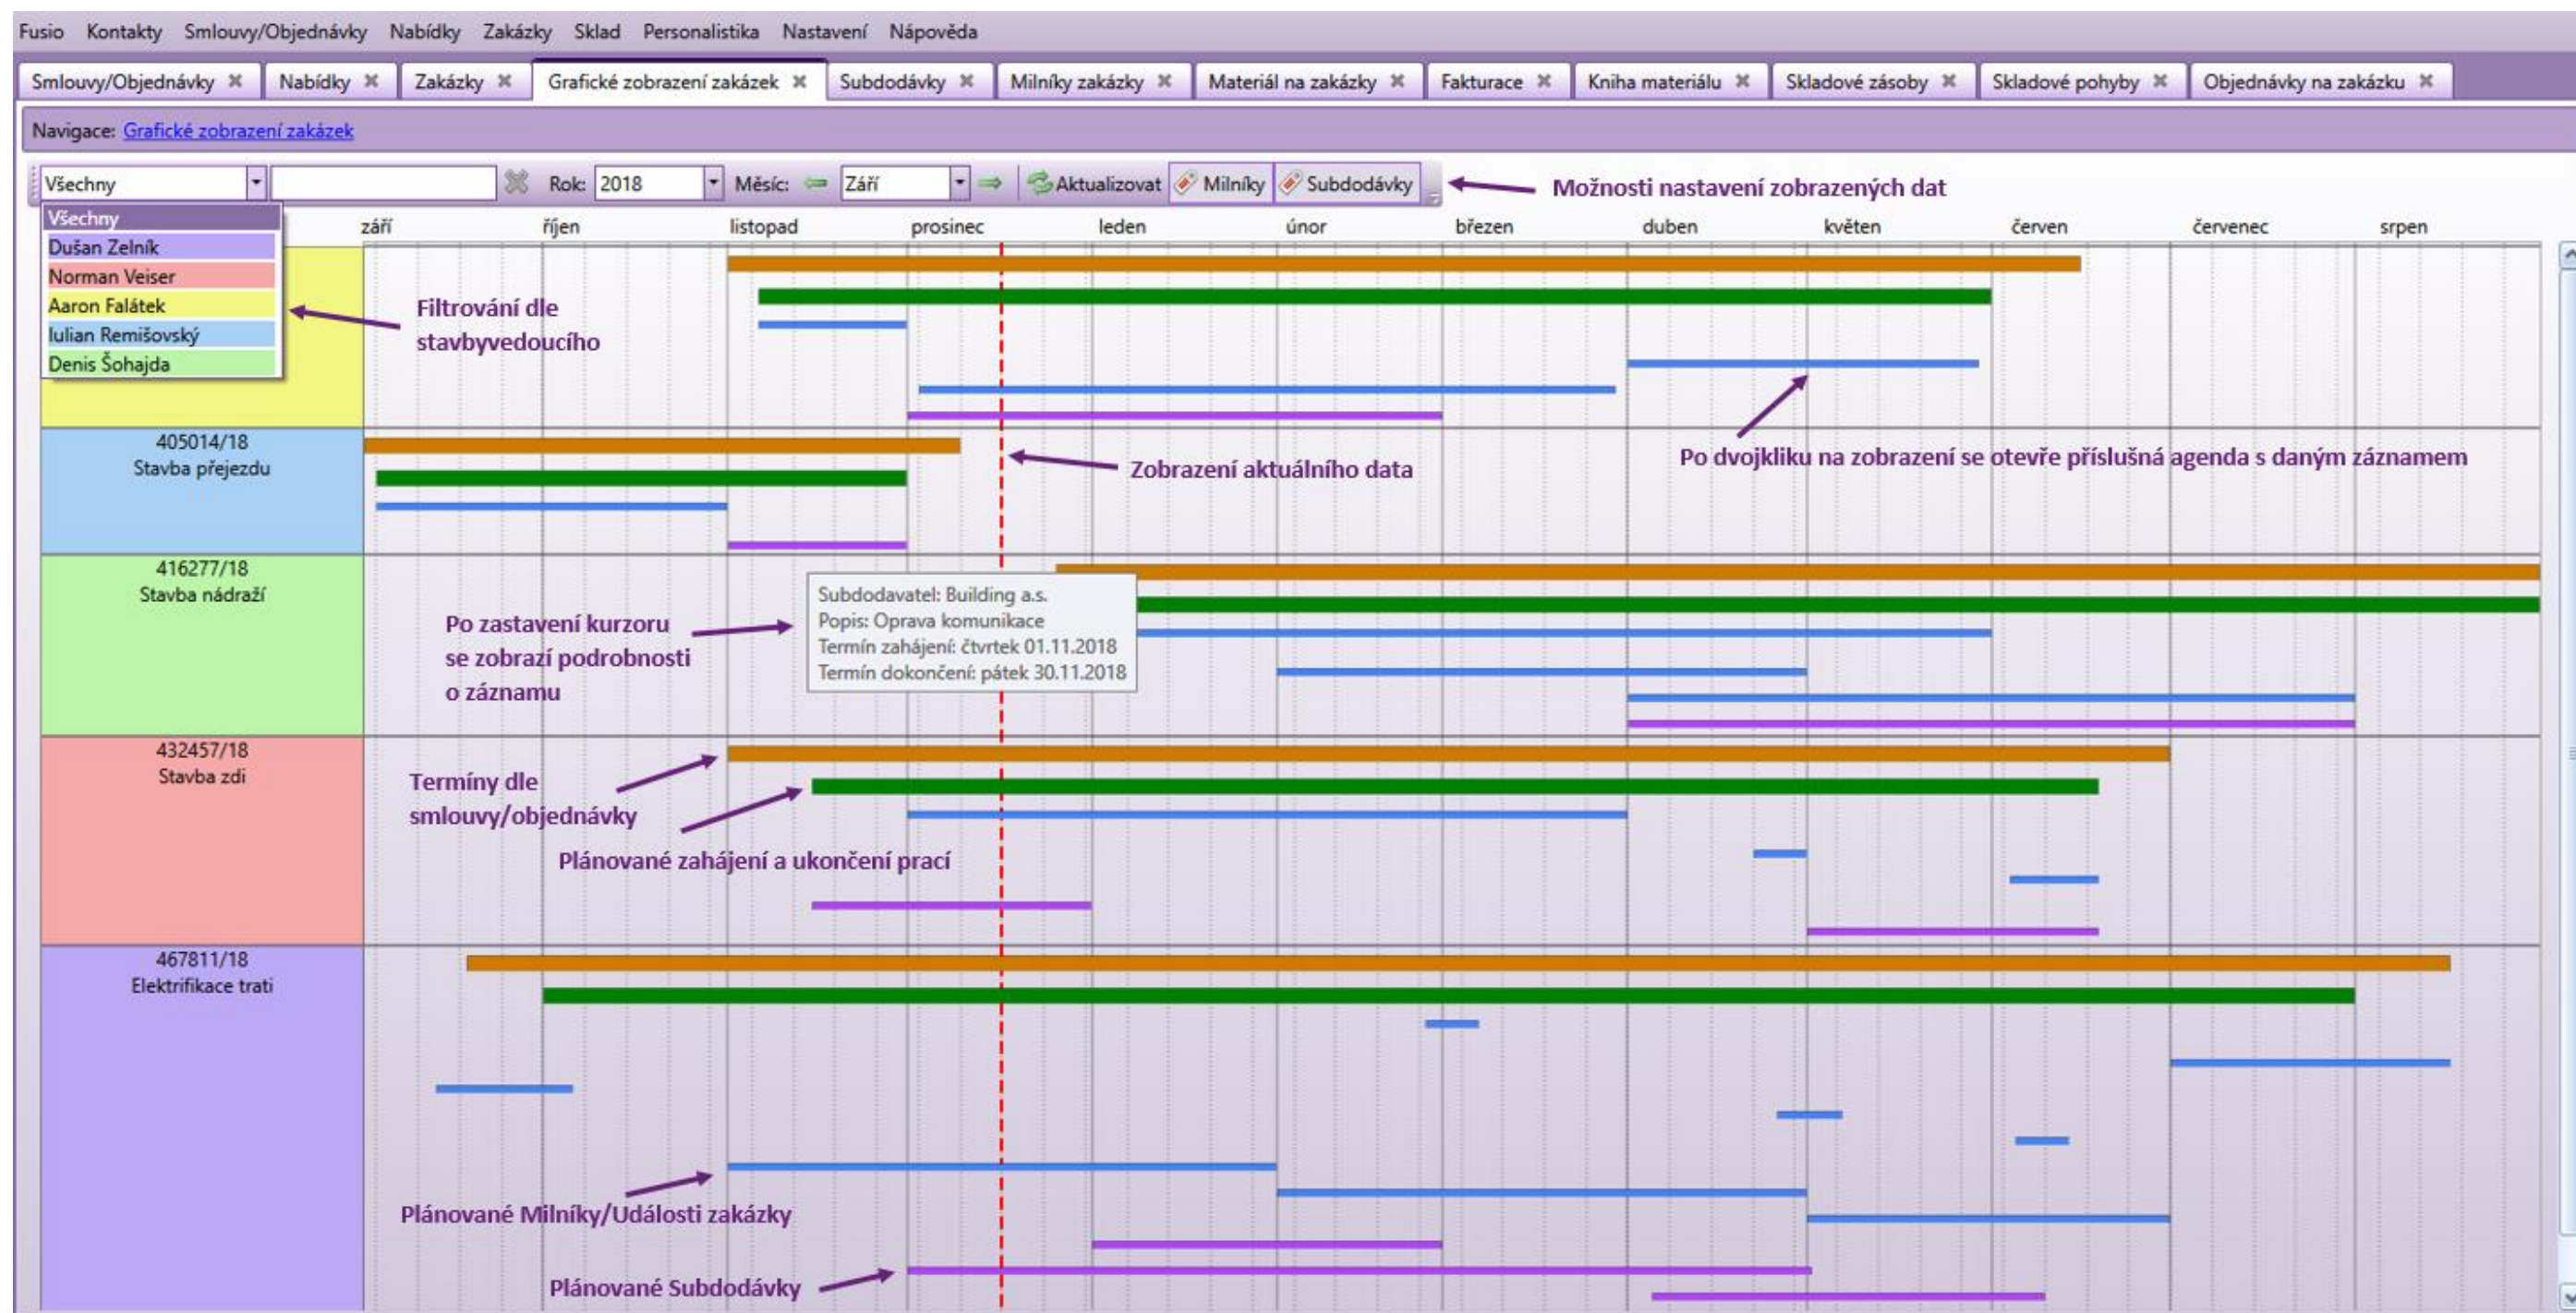



Materiál

Jedním z hlavních požadavků na nový systém Fusio bylo zjednodušení evidencí materiálu a jeho kvalitní příprava na zakázku. Dříve vyžadovalo vedení agendy spoustu práce i času, a navíc bylo velmi složité sdílet informace o stavu materiálu k zakázkám napříč firmou.

Propojení s ekonomickým softwarem Money

Ke každé zakázce je ve Fusio možné evidovat materiál, potřebný k její realizaci. Ve společnosti AK signal Brno byla agenda Materiál propojena s ERP systémem Money. Z tohoto softwaru se do Fusio importují skladové položky, které jsou v Money primárně evidovány. To umožňuje, pro potřeby zakázek, volbu relevantního materiálu, kontrolu stavů položek, skladových pohybů a výdejek. U skladových výdejek se v ERP eviduje číslo zakázky. Import probíhá automaticky v naplánovaných časech a oprávněný uživatel si jej může spustit i kdykoliv ručně. Díky importům z ERP mají všichni oprávnění uživatelé Fusio přístup k informacím o aktuálním stavu materiálu na skladě.

Příprava materiálu na zakázku

Materiál na zakázku má na starosti Přípravář. Někdy je vydefinován již ve fázi Nabídky, z důvodu nacenění. V takovém případě se položky materiálu přenesou při založení nové Zakázky již z agendy Nabídky, kde byly ve stavu „V přípravě“. Při změně Nabídky na Zakázku, změní Přípravář stav u veškerého materiálu na „Požadováno“ jedním pokynem. Materiál lze samozřejmě průběžně doplňovat a měnit.

Pro interní potřeby lze seznam požadovaného materiálu vytisknout ve formě přehledného formuláře nebo vyexportovat jako PDF či tabulku MS Excel. Report se seznamem potřebného materiálu se zašle také do skladu, kde materiál skladník alokuje pro danou zakázku, nebo ho objedná.

Stavy se u Materiálu průběžně mění z „V přípravě“, přes „Požadováno“, „Objednáno“, „Připraveno“ až po „Vydáno“. Některé aktualizace stavu materiálu probíhají automaticky importem skladových pohybů z Money. Vlastní rezervace materiálu na zakázku probíhá ve Fusio, což umožňuje pracovat i s tím materiálem, který zbyl z jiné zakázky a už nefiguruje v ERP. Agenda je doplněna také o systém Objednávek. V případě, že materiál není skladem a je nutné ho objednat, má uživatel možnost potřebný materiál sdružit do objednávky a vytisknout prostřednictvím tiskové sestavy, která je v systému již předdefinována.

Skladové položky

Do této agendy jsou automaticky importovány všechny skladové položky z ERP Money včetně skladových pohybů.

Fusio Kontakty Smlouvy/Objednávky Nabídky Zakázky Sklad Personalistika Nastavení Náповěda														
Nabídky Smlouvy/Objednávky Grafické zobrazení zakázek Kniha materiálu Skladové položky Objednávky na zakázku Firmy Zakázky Systémový log Smlouvy/Objednávky Kniha materiálu Skladové položky														
Navigace: Skladové položky														
Vše rele Filtr Nastavení filtru Tisk Graf Aktualizovat Import dat z Money Nastavit Přidat Upravit Kopírovat Smazat														
	Název položky	Číslo dokladu	Číslo katalogu	Počet	MJ	Zkratka	Číslo PLU	Cena	Sklad	Datum	Celkem na příjmech	Rezervovaný materiál	Celkem na výdejích	Objednaný materiál
				Σ 7 296,00										
	Cívka relé 1,7 ohm 71140a 72140 5001 000 01	V21800159	71140	6,00	ks	Relé	1	633,18	2	28.11.2017	54 067,00		24 447,00	
	Cívka relé 1500 ohm 71140d 72140 5004 000 01	V21800159	71140	6,00	ks	Relé	2	656,18	2	28.11.2017	22 552,00		22 155,00	
	Cívka relé 550 ohm 71140g 72140 5007 000 01	V21800159	71140	6,00	ks	Relé	3	545,18	2	28.11.2017	10 234,00		16 280,00	
	Cívka relé 30 ohm 71140j 72140 5010 000 01	V21800159	71140	6,00	ks	Relé	4	541,18	2	28.11.2017	5 819,00		11 794,00	
	Cívka relé 35 ohm 71140k 72140 5011 000 01	V21800159	71140	6,00	ks	Relé	5	574,18	2	28.11.2017	9 633,00		6 103,00	
	Cívka relé 90 ohm 71140n 72140 5014 000 01	V21800159	71140	6,00	ks	Relé	6	550,18	2	28.11.2017	861,00		9 378,00	
	Cívka relé 200 ohm 71140p 72140 5016 000 01	V21800159	71140	6,00	ks	Relé	7	666,18	2	28.11.2017	341,00		2 763,00	
	Cívka relé 0,25 ohm 71140r 72140 5018 000 01	V21800159	71140	6,00	ks	Relé	8	574,18	2	28.11.2017	148,00		6 831,00	
	Cívka relé 0,7 ohm 71140s 72140 5019 000 01	V21800159	71140	6,00	ks	Relé	9	626,18	2	28.11.2017	528,00		7 524,00	
	Cívka relé 500 ohm 71141d 72141 5004 000 01	V21800159	71141	6,00	ks	Relé	10	801,18	2	28.11.2017	587,00		3 759,00	
	Cívka relé 1750 ohm 71141g 72141 5007 000 01	V21800159	71141	6,00	ks	Relé	11	886,13	2	28.11.2017	557,00		8 096,00	
	Cívka relé 2000 ohm 71140e 72140 5005 000 01	V21800159	71140	6,00	ks	Relé	12	662,18	2	28.11.2017	724,00		3 594,00	
	Cívka relé 750 ohm 71141e 72141 5005 000 01	V21800159	71141	20,00	ks	Relé	13	906,66	2	28.11.2017	1 728,00		2 013,00	
	Relé malorozměrové NMŠ1-2000 72120c	V21800165	72120	12,00	ks	Relé	6	4 660,00	2	30.11.2017	861,00		9 378,00	
	Relé malorozměrové NMŠ2-4000 72121a	V21800165	72121	3,00	ks	Relé	7	4 120,00	2	30.11.2017	341,00		2 763,00	
	Relé malorozměrové NMŠ1-10/3500 72120n	V21800165	72120	4,00	ks	Relé	8	4 096,00	2	30.11.2017	148,00		6 831,00	
	Relé malorozměrové NMŠ1-3,4 72120a	V21800165	72120	2,00	ks	Relé	9	4 096,00	2	30.11.2017	528,00		7 524,00	
	Relé malorozměrové NMŠM2-3500 72121f	V21800172	72121	1,00	ks	Relé	1	4 300,00	2	04.12.2017	54 067,00		24 447,00	
	Relé malorozměrové NMPŠ4-1000/200 72134a	V21800209	72134	1,00	ks	Relé	4	3 400,00	2	20.12.2017	5 819,00		11 794,00	
	Relé časové CRM-83J/UNI ZR 1-10s 8595188119757	P21800186	83110	1,00	ks	Relé	2	580,33	2	20.12.2017	22 552,00		22 155,00	
	Relé fázové HRN-57N 8595188137249 ELKO-EP	P21800186	57	1,00	ks	Relé	3	862,31	2	20.12.2017	10 234,00		16 280,00	
	Stojan releový izolovaný (19p) 72511d	V21800218	72511	1,00	ks	Stojan	1	7 820,00	2	05.01.2018	54 067,00		24 447,00	
	Patice SCHRACK 2pól, YRT 78626	P21800207	7862	2,00	ks	Relé	2	69,60	2	11.01.2018	22 552,00		22 155,00	
	Relé dohlédací třířízové DRT 71974a	V21800238	71974	1,00	ks	Relé	3	7 710,00	2	12.01.2018	10 234,00		16 280,00	
	Relé malorozměrové NMŠ2-4000 72121a	V21800238	72121	2,00	ks	Relé	4	4 120,00	2	12.01.2018	5 819,00		11 794,00	
Skladové pohyby (3) Materiál na zakázku														
Filtr Nastavení filtru Tisk Graf Aktualizovat Přejít Import dat z Money Nastavit Přidat Upravit Kopírovat Smazat														
	Typ	Datum pohybu	Číslo katalogu	Název položky	Množství	MJ	Cena	Číslo zakázky	Název zakázky ve Fusio	CKMK	Datum a čas importu	Sklad	Číslo dokladu	Celková cena
														Σ 55 920,00
	V	30.11.2017	72120	Relé malorozměrové NMŠ1-2000 72120c	3,00	ks	4 660,00			165	02.02.2018 02:01:36	2	V21800165	13 980,00
	V	30.11.2017	72120	Relé malorozměrové NMŠ1-2000 72120c	4,00	ks	4 660,00			165	02.02.2018 02:01:36	2	V21800165	18 640,00
	V	30.11.2017	72120	Relé malorozměrové NMŠ1-2000 72120c	5,00	ks	4 660,00			165	02.02.2018 02:01:36	2	V21800165	23 300,00

Kniha materiálů

Jedná se o agendu, ve které jsou sdruženy všechny položky materiálu, potřebné na zakázky, v různém stavu připravenosti. Agenda slouží jako souhrnný přehled nad veškerým materiálem. Při zadávání požadavku na materiál se samozřejmě uvádí i číslo zakázky, pro kterou je materiál určen. Proto je u každé položky samostatná podagenda Materiál na zakázku, kde je vidět, pro jakou konkrétní zakázku je materiál určen. Stejně tak je i v agendě Zakázky u každé položky vidět soupis materiálu potřebného k její realizaci.

Fusio Kontakty Smlouvy/Objednávky Nabídky Zakázky Sklad Personalistika Nastavení Nápořád

Nabídky Skladové položky Nabídky Grafické zobrazení zakázek Kniha materiálů Objednávky na zakázku

Navigace: Kniha materiálů

Vše Filtr Nastavení filtru Tisk Graf Aktualizovat Import dat z Money Nastavit Přidat Upravit Kopírovat Smazat

	Sklad	Datum a čas založení požadavku	Číslo katalogu	Název položky	Požadované	Mj	Číslo zakázky	Název zakázky	Číslo objednávky	Stav	Rezervovat	Termín na žadance	Termín na objednavce	Termín do
					Σ	30,00					Σ	0,00		
	5 - Výroba	18.12.2018 15:30		zabezpečovací zařízení	3,00		405014/18	Stavba přejezdu		Připraveno	0,00	19.12.2018		
	2 - Provoz	18.12.2018 16:26		reléové stávedlo	5,00		416277/18	Stavba nádraží		Objednáno	0,00	01.04.2019		
	5 - Výroba	18.12.2018 16:30		dálkové ovládání přejezdového zabezpečovacího zaří	1,00		405014/18	Stavba přejezdu		Ve výrobě	0,00	19.12.2018		
	5 - Výroba	18.12.2018 16:34		dispečerový traťový souhlas	2,00		416277/18	Stavba nádraží		Požadováno	0,00	07.01.2019		
	2 - Provoz	18.12.2018 16:39		dálkové ovládání pro tratě	1,00		467811/18	Elektrifikace tr...		Objednáno	0,00	15.01.2019		
	2 - Provoz	18.12.2018 16:44		samovratný přestavnik	10,00		416277/18	Stavba nádraží		Objednáno	0,00	19.12.2018		
	5 - Výroba	18.12.2018 16:51		časová jednotka	4,00		467811/18	Elektrifikace tr...		Připraveno	0,00	12.01.2019		
	5 - Výroba	18.12.2018 16:54		počítač náprav	1,00		416277/18	Stavba nádraží		Vydáno	0,00	31.01.2019		
	2 - Provoz	28.01.2019 16:44		Start dohledu 71993 5 408	1,00		4679	oprava nadjez...		V přípravě	0,00			
	2 - Provoz	28.01.2019 16:45		Kříž výstražný dvojitý 00264c	1,00		4679	oprava nadjez...		V přípravě	0,00			
	2 - Provoz	05.02.2019 14:19		Relé časové CRM-61/UNI	1,00	ks	456788	kanalizace a o...		V přípravě	0,00			

Stav přípravy materiálu

Skladové zásoby Skladové pohyby položky Materiál na zakázku (1) Rezervace na jiné zakázky Zakázky (1) Přílohy

Vše Filtr Nastavení filtru Tisk Graf Aktualizovat Přejít Nastavit Přidat Upravit Kopírovat Smazat

	Číslo zakázky	Plánované zahájení	Název	Nabídka	Objednatel	Stavbyvedoucí	Plánované ukončení	Výklad stavby	Zajištění PD	Zajištění PD poznámka	Subdodávky	Subdodávky poznámka	Regulace	Regulace osoba	Regulace
	416277/18	01.01.2019	Stavba nádraží	NAB2019/0004	STANEC CZ spol. s r.o., Albin Čer...	Šohajda Denis	31.08.2019	06.12.2018	✓	v pořádku	✓	dodržet termín	✓	Lasiková Žitomíra	proj

V podagendě bližší informace o zakázce k označenému materiálu v hlavním seznamu

Formulář pro zadání požadavku na materiál

Pracovník zjistí celkovou potřebu materiálu a zapíše ji do pole 1. V poli 2 má přehled o aktuálním stavu materiálu v ERP. Potřebné množství materiálu může na konkrétní zakázku rezervovat v poli 3, čímž se po uložení sníží dostupné množství pro pokrytí dalších požadavků v poli 4. Pokud je k dispozici materiál, který není fyzicky na skladě, např. zbytek z jiné zakázky, může ho pracovník použít a jeho množství zadat do pole 5. V poli 6 se automaticky spočítá potřebné množství, které se má objednat, přičemž počet lze upravit ručně, mají-li např. zůstat další kusy na skladě. Pole 7 slouží pro přidání potřebného množství do již existující objednávky. Proklikem do agendy Objednávky lze také založit objednávku novou.

Název požadovaného materiálu importovaný z ERP

Ze seznamu vybrané číslo zakázky

Prostor, kam lze zapisovat údaje o dodávkách pro interní potřebu

Informace o zaměstnanci, který požadavek založil

Objednávky materiálu

Slouží k zadávání objednávek požadovaného materiálu a vytváření automaticky číslovaných objednávek na dodavatele.

Fusio Kontakty Smlouvy/Objednávky Nabídky Zakázky Sklad Personalistika Nastavení Náповěda

Nabídky ✕ Skladové položky ✕ Nabídky ✕ Grafické zobrazení zakázek ✕ Kniha materiálu ✕ Objednávky na zakázku ✕ Objednávky na zakázku ✕

Navigace: [Objednávky na zakázku](#)

Vše Filtr Nastavení filtru Tisk Graf Aktualizovat Nastavit Přidat Upravit Kopírovat Smazat

	Dodavatel	Datum objednávky	Stav	Popis	Číslo objednávky	Datum vystavení	Vyřídít do	Vystavil (a)	Doprava	Platební podmínky	Poznámka	Text objednávky
	Building a.s., Sídlο firmy	17.12.2018	Objednáno	Cihly, 5000 ks	OBV2019/0001	17.12.2018	21.12.2018	Slekovič Quido	dodavatelem	převodem		Objednáváme u Vás níže uvedený materiál na základě
	Elektrifikace spol. s r.o., Sídlο firmy	17.12.2018	Objednáno	reléové stávédlο	OBV2019/0002	19.12.2018	03.01.2019	Slekovič Quido	vlastní	převodem		Objednáváme u Vás níže uvedený materiál na základě
	Elektrifikace spol. s r.o.	14.11.2018	Rozpracováno	počítač náprav	OBV2019/0003	19.12.2018	16.01.2019	Slekovič Quido	osobně	hotově		Objednáváme u Vás níže uvedený materiál na základě
	Building a.s., Sídlο firmy	04.12.2018	Objednáno	přestavník	OBV2019/0004	06.12.2018	07.01.2019	Helikar Roman	dodavatelem	převodem		Objednáváme u Vás níže uvedený materiál na základě
	Elektrifikace spol. s r.o.	12.12.2018	Rozpracováno	stabilizátor	OBV2019/0005	19.12.2018	30.01.2019	Slekovič Quido	vlastní	platební kartou		Objednáváme u Vás níže uvedený materiál na základě
	Building a.s., Sídlο firmy	11.12.2018	Objednáno	dobijec	OBV2019/0006	19.12.2018	21.12.2018	Slekovič Quido	přepravní služba	převodem		Objednáváme u Vás níže uvedený materiál.

Seznam objednávek

Položky objednávky (2) Přílohy (2)

Vše Filtr Nastavení filtru Tisk Graf Aktualizovat Přejít Import dat z Money Nastavit Přidat Upravit K

	Sklad	Název položky	Datum a čas založení	Požadované	Mj	Číslo zakázky	Název zakázky	Číslo objednávky	Stav	Rezervovat	Termín na ž
				Σ	7,00					Σ	0,00
	5 - Výroba	Jistič BA511 - 33 - 50 100A	06.02.2019 13:50	5,00		467811/18	Elektrifikace tr...	OBV2019/0006	Objednáno	0,00	
	2 - Provoz	Jistič C60H 3P 32A	06.02.2019 13:50	2,00		432457/18	Stavba zdi	OBV2019/0006	Objednáno	0,00	

Tisková sestava vlastní objednávky, včetně položek

Vystavená objednávka

Příjemce: AK signal Brno a.s. Kukova 944/26 614 00 Brno-Staroměstice o Oblast Tel.: +420 545233486 Fax: +420 545233487 IČO 26245007 DIČ CZ26455007	Doklad číslo: OBV2019/0006 Dodavatel: Building a.s., Sídlο firmy Obchod 2 29000 Praha IČO 32156790 DIČ CZ32156790
--	--

Datum vystavení: 19.12.2018 **Vystavil (a):** Slekovič Quido

Doprava: přepravní služ... Platební podmínky: převodem

Na fakturu vždy uvádějte číslo objednávky

Text objednávky:
Objednáváme u Vás níže uvedený materiál.
Materiál odejde do našeho skladu Markety Kunecov 9, Brno.
Zašleme Vás o potvrzení objednávky a termínu dodání, děkujeme, spěchá.

Položka	Zakázka	Katalog	Množství	Mj	Požadovaný termín
Jistič BA511 - 33 - 50 100A	467811/18		5,00		
Jistič C60H 3P 32A	432457/18		2,00		

Registrační:
Společnost zapadá v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3888
Nášle společnost je součástí systému EKO - KOM dle zák. 477/2001 Sb. o oblastech. Uzavřená smlouva o sdruženém přístupu - klientálně Z. 113218.

razítko, podpis

Dodavatel se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající z legislativy ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany a zajistí, aby jeho zaměstnanci byli řádně vyškoleni a vycvičení v opadách svých činností včetně řešení havarijních situací. Dodavatel se dále zavazuje k respektování zavedeného integrovaného systému řízení objednávky.

Strana: 1

Vygenerováno systémem ANTS Fusio



Subdodávky zakázek

Agenda slouží k evidenci subdodávek pro jednotlivé zakázky. Domluvené termíny se zobrazují v grafickém rozhraní zakázek.

Fusio
Kontakty
Smlouvy/Objednávky
Nabídky
Zakázky
Sklad
Personalistika
Nastavení
Nápověda

Nabídky
Skladové položky
Nabídky
Grafické zobrazení zakázek
Kniha materiálu
Objednávky na zakázku
Objednávky na zakázku
Subdodávky

Navigace: Subdodávky

Filtr
Nastavení filtru
Tisk
Graf
Aktualizovat
Nastavit
Přidat
Upravit
Kopírovat
Smazat

	Zakázka	Popis	Subdodavatel	Uzavřená smlouva	Uzavřená objednávka	Poznámka	Termín zahájení	Termín ukončení
	40500/18: Oprava mostu (ANTS spol. s r.o., Benedikt Křištof)	Oprava pilířů	Kosmická a.s., Benjamin Sova	: Oprava pilířů			01.12.2018	28.02.2019
	405014/18: Stavba přejezdu (STAND CZ spol. s r.o., Albín Černíček)	Oprava komunikace	Building a.s., Sídlo firmy	223:			01.11.2018	30.11.2018
	416277/18: Stavba nádraží (STAND CZ spol. s r.o., Albín Černíček)	rekonstrukce střechy	ANTS spol. s r.o.,	2367/18: Subdodávka			01.04.2019	31.07.2019
	432457/18: Stavba zdi (Obec Merkur, Sídlo firmy)	demoliční a výkopové práce	Building a.s., Květoslav Včelka	23756: výkopové práce			15.11.2018	31.12.2018
	432457/18: Stavba zdi (Obec Merkur, Sídlo firmy)	subdodávka - povrchové úpravy zdi	Building a.s., Sídlo firmy	34589/18: subdodávka - povrchové úpravy zdi	ano		01.05.2019	18.06.2019
	467811/18: Elektrifikace trati (STAND CZ spol. s r.o., Albín Černíček)	subdodávka elektrifikace A5	Elektrifikace spol. s r.o., Sídlo firmy	: elektrifikace úseku A5	ano		01.01.2019	28.02.2019
	467811/18: Elektrifikace trati (STAND CZ spol. s r.o., Albín Černíček)	kabeláž	Elektrifikace spol. s r.o., Sídlo firmy	456072: kabeláž	ano 15.11.2018		01.12.2018	01.05.2019
	467811/18: Elektrifikace trati (STAND CZ spol. s r.o., Albín Černíček)	terénní úpravy	Výkopy spol. s r.o., Sídlo firmy	4367: terénní práce	15.3.2019		05.04.2019	09.06.2019

OK
Zrušit
Použít
Aktualizovat
Nastavit
Tisk

Zakázka
432457/18: Stavba zdi (Obec Merkur, X)

Subdodavatel
Building a.s., Květoslav Včelka

Uzavřená smlouva
23756: výkopové práce

Uzavřená objednávka

Termín zahájení
15. listopadu 2018

Termín ukončení
31. prosince 2018

Popis
demoliční a výkopové práce

Poznámka

Přidat
Otevřít
Stáhnout
Smazat
Aktualizovat

Datum a čas
Uživatel
Titulek
Typ souboru
Soubor

Komentář

Zadávací formulář



Milníky zakázek

Agenda slouží podle potřeby ke stanovení časových událostí, které se vztahují ke konkrétní zakázce, a u kterých je třeba dohlédnout na termíny. Agenda je spojena s reporty, pomocí kterých jsou zodpovědní pracovníci, podle funkce a zařazení ke konkrétní zakázce, předem informováni o termínech, které bude brzy třeba splnit. Evidované termíny se zobrazují v Grafickém rozhraní zakázek pro lepší přehled managementu.

Fusio Kontakty Smlouvy/Objednávky Nabídky Zakázky Sklad Personalistika Nastavení Nápoředa

Nabídky x Skladové položky x Nabídky x Grafické zobrazení zakázek x Kniha materiálu x Objednávky na zakázku x Objednávky na zakázku x Subdodávky x Milníky zakázky x

Navigace: Milníky zakázky

Vše Filtr Nastavení filtru Tisk Graf Aktualizovat Nastavit Přidat Upravit Kopírovat Smazat

	Číslo zakázky	Název zakázky	Datum	Popis	Poznámka	Datum zahájení	Datum ukončení	Datum podpisu smlouvy	Datum platnosti smlouvy	Datum plánovaného zahájení zakázky	Datum plánovaného ukončení zakázky
	40500/18	Oprava mostu	06.11.2018	Fáze I		06.11.2018	30.11.2018			06.11.2018	31.05.2019
	40500/18	Oprava mostu	01.04.2019	fáze III		01.04.2019	29.05.2019			06.11.2018	31.05.2019
	40500/18	Oprava mostu	03.12.2018	fáze II		03.12.2018	29.03.2019			06.11.2018	31.05.2019
	405014/18	Stavba přejezdu	01.11.2018	Dodání subdodávky od Building a.s.				01.03.2019	03.09.2018	03.09.2018	30.11.2018
	405014/18	Stavba přejezdu	08.10.2018	Fáze I		03.09.2018	31.10.2018	01.03.2019	03.09.2018	03.09.2018	30.11.2018
	416277/18	Stavba nádraží	01.04.2019	Dodání subdodávky od ANTS spol. s r.o.		01.01.2019	31.05.2019	30.08.2019	01.01.2019	01.01.2019	31.08.2019
	416277/18	Stavba nádraží	07.12.2018	2. fáze výstavby		01.02.2019	30.04.2019	30.08.2019	01.01.2019	01.01.2019	31.08.2019
	416277/18	Stavba nádraží	10.12.2018	3. fáze výstavby		01.04.2019	31.07.2019	30.08.2019	01.01.2019	01.01.2019	31.08.2019
	432457/18	Stavba zdi	15.11.2018	fáze I		01.12.2018	31.03.2019	28.02.2019	15.11.2018	15.11.2018	18.06.2019
	432457/18	Stavba zdi	01.05.2019	Dodání subdodávky od Building a.s.				28.02.2019	15.11.2018	15.11.2018	18.06.2019
	432457/18	Stavba zdi	08.11.2018	dokončení hrubé stavby		22.04.2019	30.04.2019	28.02.2019	15.11.2018	15.11.2018	18.06.2019
	432457/18	Stavba zdi	08.11.2018	finální konzultace		04.06.2019	18.06.2019	28.02.2019	15.11.2018	15.11.2018	18.06.2019
	467811/18	Elektrifikace tr...	01.01.2019	Dodání subdodávky od Elektrifikace spol. s r.o.		26.02.2019	06.03.2019		01.10.2018	01.10.2018	31.07.2019
	467811/18	Elektrifikace tr...	26.09.2018	finalizace a předání zakázky		01.07.2019	16.08.2019		01.10.2018	01.10.2018	31.07.2019
	467811/18	Elektrifikace tr...	13.09.2018	Přípravné a zahajovací práce		13.09.2018	05.10.2018		01.10.2018	01.10.2018	31.07.2019
	467811/18	Elektrifikace tr...	01.12.2018	Dodání subdodávky od Elektrifikace spol. s r.o.		26.04.2019	06.05.2019				
	467811/18	Elektrifikace tr...	05.04.2019	Dodání subdodávky od Výkopy spol s r.o.		05.06.2019	13.06.2019				
	467811/18	Elektrifikace tr...	10.09.2018	Elektrifikace - fáze I		01.11.2018	31.01.2019				
	467811/18	Elektrifikace tr...	11.09.2018	Elektrifikace - fáze II		01.02.2019	30.04.2019				

Přiložky

Přidat Otevřít Stáhnout Smazat Aktualizovat

Datum a čas Uživatel Titulek Typ souboru Soubor

Komentář

OK Zrušit Použít Aktualizovat Nastavit Tisk

Zakázka
40500/18: Oprava mostu (ANTS spol. s r.o., Benedikt Křištof)

Popis
Fáze I

Poznámka

Datum
6. listopadu 2018

Datum zahájení
6. listopadu 2018

Datum ukončení
30. listopadu 2018

Zadávací formulář



Fakturace

Agenda slouží pro přehled managementu o fakturaci zakázek a jejich termínech. Jednotlivé sloupce se sčítají, takže je na první pohled zřejmé, jakou částku ještě zbývá fakturovat na danou zakázku. Pro kontrolu a dostupnost údajů má agenda Fakturace i celou řadu podagend.

Fusio Kontakty Smlouvy/Objednávky Nabídky Zakázky Sklad Personalistika Nastavení Nápověda

Nabídky x Skladové položky x Nabídky x Grafické zobrazení zakázek x Kniha materiálu x Objednávky na zakázku x Objednávky na zakázku x Subdodávky x Milníky zakázky x Fakturace x

Navigace: Fakturace

Vše [] Filtr Nastavení filtru Tisk Graf Aktualizovat Nastavit Přidat Upravit Kopírovat Smazat

Č. zakázky	Název zakázky	Uzavřeno	Číslo nabídky	Předmět	Číslo sml/obj	Obchodní partner	Částka dle SOD	Měna	Fakt. celkem	Zbývá fakturovat	Plánované ukončení	Ukončení dle SOD	Ukončení dle obj.	ZP 1 - částka	ZP
40500/18	Oprava mostu		NAB2019/0001		OBP2019/0001	ANTS spol. s r.o., Benedikt Křištof	Σ 6 780 000,00	Kč	Σ 1 770 000,00	Σ 5 010 000,00	31.05.2019		15.06.2019		0,00
405014/18	Stavba přejezdu		NAB2019/0002	223		STAND CZ spol. s r.o., Albin Černíč	200 000,00	Kč	200 000,00	0,00	30.11.2018	01.03.2019	09.12.2018		50 000,00
467811/18	Elektrifikace trati		NAB2019/0003	456072		STAND CZ spol. s r.o., Albin Černíč	80 000,00	Kč	70 000,00	10 000,00	31.07.2019		16.08.2019		10 000,00
416277/18	Stavba nádraží		NAB2019/0004		OBP2019/0006	STAND CZ spol. s r.o., Albin Černíč	5 000 000,00	Kč	300 000,00	4 700 000,00	31.08.2019	30.08.2019	05.09.2019		100 000,00
432457/18	Stavba zdi		NAB2019/0004	23756		Obec Merkur, Sídlo firmy	1 500 000,00	Kč	1 200 000,00	300 000,00	18.06.2019	28.02.2019	30.06.2019		200 000,00
4679	oprava nadjezdu Brno		NAB2019/0007			ANTS spol. s r.o., Radmil Karina			0,00	0,00					0,00
456788	kanalizace a odvodnění		NAB2019/0008			Building a.s., Květoslav Včelka			0,00	0,00					0,00

Součtová pole

Nabídka (1) Zakázka (1) Smlouvy/Objednávky dle zakázky (1) Smlouva/ Objednávka vybraná u fakturace (1) Přílohy

Nabídky aktuálního fiskálního roku [] Filtr Nastavení filtru Tisk Graf Aktualizovat Přejít Nastavit Přidat Upravit Kopírovat Smazat

Číslo nabídky	Číslo zakáz	Zpracování - osoba	Název	Objednatel	Předmět	Nabídková cena bez DPH	Měna	Datum poptávky	Založení - osoba	Založení - datum	Zpracování - datu	Termín odevz	Schválení - osot
Σ						500 000,00							
NAB2019/0001	40500/18	Slekovič Quido	Oprava mostu	ANTS spol. s r.o., Benedikt Křištof		500 000,00	Kč	16.10.2018	Slekovič Quido	05.12.2018	05.12.2018	02.11.2018	Kitlicka Metodě

Doplňující informace k vybrané fakturaci
